



Musan kentän tarveselvitys

Porin kaupunki, tila- ja infrayksikkö 2025

Tiivistelmä	3
1. Hankkeen tausta	4
1.1. Porin kaupungin tavoitteet.....	5
2. Perusteltu selvitys tilantarpeesta ja sen käytöstä	6
2.1. Pääkenttä	6
2.2. Juniorikentät	8
2.3. Katsomorakenteet	8
2.4. Alueen asukkaiden ja muiden käyttäjien tarpeet.....	9
2.5. Pysäköinti	10
2.6. Huoltotilat	10
3. Selvitys kaavatilanteesta	11
3.1. Yleissuunnitelma	11
3.2. Asemakaava.....	12
4. Rakennushanke	15
4.1. Rahoituksen liittyvät näkökohdat.....	15
4.2. Rakennusalue	15
4.3. Hankkeen vaiheistus	16
4.4. Hankkeen alustava jatkoaikataulu.....	17
4.4.1. VAIHE 1, Jalkapallotekonurmen rakentaminen	17
4.4.2. VAIHE 2, Pääkentän ja tekonurmialueen katsomorakenteet.....	17
4.4.3. Vaihe 3, Rinteentien yleisliikunta-alueen rakentaminen	17
4.4.4. Vaihe 4, Leikkiliikuntapuisto	18
LIITTEET	18

Tiivistelmä

Musan kentän tarveselvitys on laadittu Länsi-Porissa sijaitsevan jalkapallokäytössä olevan kenttäalueen kehittämiseksi alueesta laaditun ja teknisen lautakunnan hyväksymän Musan kentän yleissuunnitelman mukaisesti. Yleissuunnitelma on laadittu alueen keskeisten toimintojen kehittämiseen, sijoitteluun ja mitoittamiseen, sisäisen liikenteen järjestämiseen eri tilanteissa ja eri käyttäjäryhmille sekä aluerakenteiden kuten aitojen, porttien ja valaistuksen sijoitteluun. Suunnitelman tavoitteena on kehittää alueesta idyllinen ja toimiva paikka merkittävän kokoluokan jalkapalloseuran harjoitus- ja kilpailutoiminnalle sekä lähialueen eri ikäistä väestöä palveleva lähiliikuntapaikka. Alueen kehittäminen on myös osa koko kaupungin kattavaa liikuntapaikkasuunnitelmaa. Suunnittelua ovat ohjanneet kestävä ja laadukkaan ympäristörakentamisen tavoitteet. Työssä on huomioitu erityisesti esteettömyys, saavutettavuus, yhdenvertaisuus, toiminnallisuus ja turvallisuus sekä alueen luontoarvot.

Musan kentän pääkäyttäjätaho on Länsi-Porin alueella toimiva jalkapalloseura Musan Salama, jonka toiminnassa on mukana lähes 700 eri ikäistä harrastajaa alle kouluikäisistä aikuisiin. Eri rooleissa toimivia toimihenkilöitä seuran toiminnassa on mukana n. 160. Seurassa toimii noin kaksikymmentä joukkuetta/ryhmää nappulafutiksesta tyttöjen ja poikien ikäkausijoukkueisiin sekä naisten että miesten edustusjoukkueisiin, lisäksi seurassa toimii erityisjoukkue.

Tarveselvityksessä on tarkasteltu aluetta eri kokonaisuuksittain seuraavasti:

- pääkenttä
- juniorikentät
- katsomorakenteet
- alueen asukkaiden liikkumismahdollisuudet
- pysäköinti
- huoltotilat

Tarveselvityksessä on tuotu esiin perusteluja kenttäalueen kehittämiseksi ja tietyt yleissuunnitelmassa esitetyt ratkaisut täsmentyvät vasta hankkeen edetessä tarveselvitysvaiheesta hankesuunnitteluvaiheeseen. Näitä ovat esimerkiksi hankkeen toteuttamisen vaiheistus, kenttäalueen katsomorakenteet sekä kentän mahdollinen lämmitys.

Tarveselvityksen ja sen jälkeen toteutettavan hankesuunnitelman tavoitteena on, että dokumenttien hyväksymisen jälkeen on olemassa selkeät askelmerkit ja aikataulu Musan kentän olosuhteiden kehittämiseksi.

1. Hankkeen tausta

Musan kenttä on perinteikäs kaupunginosaseuran kotikenttä, josta on vuosien kuluessa muodostunut koko kaupungin tasolla merkittävän urheiluseuran harjoitus- ja kilpailutoiminnan keskus. Kenttä on toiminut pitkään nykyisessä muodossaan ja erityisesti kenttäalueen rakenteet ovat jo peruskorjauksen tarpeessa. Kentän ja sen ympäristön toiminnalliset ominaisuudet vastaavat heikosti nykypäivän vaatimuksia.

Kenttään liittyen on vuosina 2021–2022 tehty kaksi valtuustoaloitetta, toinen paikoitusalueen laajentamista ja toinen kentän toiminnallisuuden kehittämistä koskien. Teknisen toimialan infrajohtamisen toimintayksikkö käynnisti keväällä 2022 Musan kentän pysäköintijärjestelyjä koskevan suunnitelman laatimisen yhdessä Musan Salaman, sivistystoimialan liikuntayksikön sekä teknisen toimialan liikuntapaikat-toimintayksikön kanssa. Suunnittelun aikana todettiin tarve laatia alueelle myös laajempaa kokonaisuutta koskeva yleissuunnitelma, jossa esitetään alueen tulevan kehittämisen maankäytölliset ja toiminnalliset ratkaisut. Porin kaupunki käynnisti Musan kentän yleissuunnitelman laatimisen joulukuussa 2022. Kenttää koskeva kolmas valtuustoaloite jätettiin joulukuussa 2023 ennen kentän yleissuunnitelman päätöksentekokäsittelyä. Aloitteessa esitettiin Musan kentän tekonurmihankkeen nopeuttamista.

Yleissuunnitelman tavoitteeksi asetettiin ratkaisujen etsiminen kenttäalueen keskeisten toimintojen kehittämiseen, sijoitteluun ja mitoitukseen, sisäisen liikenteen järjestämiseen sekä aluerakenteiden, kuten aitojen, porttien ja valaistuksen sijoitteluun. Tavoitteena on ollut kehittää alueesta idyllinen ja toimiva paikka sekä merkittävän kokoluokan urheiluseuran harjoitus- ja kilpailutoiminnalle että asukkaita palvelevalle lähiliikunnalle. Tekninen lautakunta hyväksyi Musan kentän yleissuunnitelman kokouksessaan 19.9.2024 § 149. Alueen kehittäminen on huomioitu myös kaupunginhallituksen hyväksymässä liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmassa (KH 10.3.2025 § 83).

Yleissuunnitelma toimii vireillä olevan alueen asemakaavamuutoksen pohjana ja varsinaiset toteutussuunnitelmat laaditaan yleissuunnitelman ja tarveselvityksen pohjalta seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Toteutussuunnittelun ja toteuttamisen ajankohdat päätetään myöhemmin.

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiorganisaation sisäisenä työnä teknisen lautakunnan hyväksymän yleissuunnitelman mukaisesti. Musan kentän pääkäyttäjätaho Musan Salaman edustajat olivat tiiviisti mukana kenttäalueen yleissuunnitelman laatimisessa ja tarveselvitys on esitelty seuran edustajille ennen päätöksentekokäsittelyä. Yleissuunnitelmaprosessin aikana osallistettiin myös muita sidosryhmiä, mm. 8.2.2023 järjestetty asukastilaisuus, johon osallistui Musan alueen asukkaita ja kentän käyttäjiä. Yleisötilaisuudessa saadut palautteet on huomioitu mahdollisuuksien mukaan suunnitelmaratkaisuissa. Tarveselvityksen jälkeen on tarkoitus siirtyä hankesuunnitelmavaiheeseen, johon seuran edustajat tulevat osallistuvat tiiviisti.

1.1. Porin kaupungin tavoitteet

Porin kaupungin tavoitteita on tuotu esiin liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelmassa sekä yleissuunnitelmasta että Musan kenttää koskevista valtuustoaloitteista annetuissa lausunnoissa.

Kaupunginhallituksen kokouksessaan 10.3.2025 § 83 hyväksymässä liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmassa on yhtenä päätavoitteena:

"Saadaan läpiviedyksi tekonurmikenttäohjelma, jolla muutetaan olemassa olevia nurmikenttiä ylläpidon ja käyttöasteen osalta paremmiksi toimiviksi tekonurmiksi."

Kehittämissuunnitelmassa on tarkennettu tavoitetta seuraavasti:

"Merkittävä osa kaupungin keskeisistä jalkapallokentistä nurmipintaisia, mikä on haaste riittävän vuorotarjonnan luomiseen sekä kenttien ylläpidolle huomioiden ylläpitoresurssit. Lisäksi yksittäisten kenttien osalta tunnistettavissa laadun kehittämisen ja peruskorjauksen tarpeita. Nykyaikaiset tekonurmikentät moninkertaistavat kenttien viikoittaiset käyttötunnit sekä pidentävät käyttökautta merkittävästi sekä alku- että loppupäästä."

Toimenpiteeksi asian edistämiseksi on asetettu:

"Muutetaan olemassa olevia jalkapallonurmikenttiä tekonurmipäällysteisiksi tekonurmikenttäohjelman mukaisesti (Itä-Pori, Musa, Toejoki, Noormarkku, Herralahti)."

Vapaa-ajan lautakunta on tuonut Musan kentän yleissuunnitelmasta 6.6.2023 § 62 antamassaan lausunnossa esiin jalkapallo-olosuhteiden kehittämistarvetta:

"Vapaa-ajan lautakunta korostaa tarvetta ajanmukaistaa jalkapallon harjoitus- ja kilpailuolosuhteita kaupungissa. Luonnonnurmikenttään verrattuna tekonurmi moninkertaistaa yksittäisen kentän viikoittaiset käyttötunnit ja pidentää käyttökautta sekä kauden alku- että loppupäästä merkittävästi. Jalkapallon kilpailukausi käynnistyy nykyisin jo maaliskuun puolella ja luonnonnurmikentät saadaan avattua käyttöön yleensä vasta toukokuun jälkimmäisellä puoliskolla. Kilpailukausi jatkuu syksyllä lokakuun puolelle, nurmikenttien käyttökauden päättyessä useimpien kenttien kohdalla viimeistään syyskuun loppupuolella. Luonnonnurmikenttien selvästi kilpailukautta lyhyempi käyttökausi asettaa isoja haasteita jalkapallon harjoitus- ja kilpailutoiminnan järjestämiselle, erityisesti kauden alku- ja loppupäässä. Lautakunta toteaa, että jalkapallo on yli 2000 pelaajan harrastajamäärältään kaupungin harrastetuin laji ja tästä syystä Musan kentän yleissuunnitelman toteuttamista tulee edistää."

Jalkapallon harjoitus- ja kilpaolosuhteiden näkökulmasta tekonurmien lisääminen on välttämätöntä, sillä tekonurmikenttä tarjoaa tasalaatuiset olosuhteet varhaisesta keväästä pitkälle syksyyn ja kestää käyttöä viikkotasolla moninkertaisen määrän luonnonnurmikenttään verrattuna. Täysimittaisia jalkapallotekonurmia on kaupungissa tällä hetkellä kaksi, urheilukeskuksen lämmitettävä tekonurmi sekä Herralahden kentän tekonurmi. Näiden lisäksi pienempiä, noin 50 % täysimittaisen kentän koosta olevia junioreiden otteluihin soveltuvia 8v8-tekonurmikenttiä on kolme, Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskuksen tekonurmi, Toejoen kentän tekonurmi sekä viimeisimpänä valmistunut Noormarkun Finpyn kentän tekonurmi. Isojen tekonurmien kohdalla parannusta tilanteeseen on tuomassa ensi vuonna toteutettava Itä-Porin kentän tekonurmi.

Musan kentän kohdalla nurmialueella sijaitsee täysimittaisen jalkapallokentän lisäksi juniorikenttiä harjoitteluun ja pelaamiseen. Nurmikenttien suunniteltu käyttökausi alkaa 15.5. ja päättyy 30.9. Kevään olosuhteista johtuen kentän käyttökausi alkaa usein vasta lähempänä kesäkuuta ja syksyn sääolosuhteiden myötä kentän käyttöön saattaa tulla käyttökatkoja syksyllä. Nurmikentän pohja tiivistynyt vuosien saatossa ja tästä aiheutuu välillä käyttökatkoja myös kesäaikaan runsaiden sateiden yhteydessä tai silloin, kun kenttä on runsaalla kuormituksella (esimerkiksi turnaukskäytössä). Nurmikenttäalueen perusta vaatisi perusteellisen remontin, mutta kentän muuttaminen tekonurmikentäksi on olosuhteiden kehittämisen kannalta selvästi kokonaisvaltaisempi ratkaisu.

2. Perusteltu selvitys tilantarpeesta ja sen käytöstä

2.1. Pääkenttä

Musan kentän kenttäalueen kokonaisala muodostuu 115 m x 120 m alueesta, joten urheilukenttäkäytössä olevan alueen kokonaispinta-ala on 13 800 m². Täysimittainen pääkenttä kattaa noin puolet kokonaispinta-alasta (6 400–7 140 m²), riippuen toteutettavan kentän mitoista. Palloliitto on määrittänyt pelikentille luokittelun sarjatasojen mukaan. Miesten Kakkonen (Musan Salaman miesten joukkueen tämän hetken sarjataso) ja Naisten Ykkönen (Musan Salaman naisten joukkue pelaa tällä hetkellä Naisten Kakkosessa) sijoittuvat luokkaan 3. Luokassa 2 pelikentän pituuden on oltava 100–105 metriä ja leveyden 64–68 metriä. Luokassa 3 pelikentän vähimmäismitat ovat 95 x 55 metriä. Palloliiton suositus kentän mitoiksi on 105 x 68 metriä. Mitat perustuvat kauden 2023 määräyksiin. Yleissuunnitelman luonnosvaiheessa tutkittiin kenttien sijoittelua ja suuntausta kahdella erikokoisella pääkentällä: 100 x 64 metriä ja 105 x 68 metriä. Kenttää ympäröivän alueen turvaetäisyytenä käytettiin 5 metriä. Tämän lisäksi kenttäalueelle mitoitettiin kaksi juniorikenttää, kooltaan 40 x 30 metriä. Luonnosvaiheen suunnitelmavaihtoehdot on esitetty 100 x 64-kokoisella kentällä.

Musan kentän pääkenttä on syytä mitoittaa niin, että se on mitoiltaan vähintään luokan 2 minimimittojen mukainen, eli 100 x 64 metriä. Näin Musan kenttä voidaan kokonsa puolesta osoittaa myös kaupungin pääsarjatason jalkapallon olosuhteeksi kehitettävän urheilukeskuksen tekonurmen varakentäksi. Tämä edellyttää myös tiettyjä vaatimuksia tekonurmelta, mm. FIFA Quality -kenttätestin läpäisemistä määräajoin. Pääsarjoilla tarkoitetaan Palloliiton määritelmän mukaisesti miesten Veikkausliigaa, Ykkösliigaa, Ykköstä ja Kakkosta sekä naisten Kansallista Liigaa, Kansallista Ykköstä sekä Kakkosta.

Jalkapallo on kehittynyt vuosien saatossa käytännössä ympärivuotiseksi lajiksi. Kilpailukausi alkaa jo varhain keväällä ja ottelun jatkuvat myöhään syksyyn. Suuntaus on sellainen, että lähivuosina valtakunnalliset sarjat tulevat alkamaan maaliskuun alussa ja päättymään marraskuun lopulla. Olosuhteiden näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että sarjaotteluita ei voida pelata luonnonnurmella, joka saadaan pelattavaan kuntoon yleensä huhti-toukokuun vaihteessa ja joka ei kestä kuormitusta enää syksyn kosteissa ja viilenevissä olosuhteissa. Jalkapallo on tästä syystä muuttumassa Suomessa tekonurmikentällä pelattavaksi lajiksi. Tällä hetkellä esimerkiksi miesten lisenssinalaisissa sarjoissa pelaa 34 joukkuetta, joista alle kymmen pelaa ottelunsa luonnonnurmella. Tulevaisuudessa määrän voi odottaa pienenevän entisestään, jalkapallostadionien ja muiden olosuhdehankkeiden edetessä eri puolilla Suomea. Jatkossa pelialustana tulee käytännössä joka paikkakunnalla olemaan tekonurmi ja tähän olosuhdekehitystä pyritään lisenssiehdoilla ohjaamaan jo tällä hetkellä.

Jalkapallotekonurmien lisäksi jalkapallon talviharjoitteluolosuhteita Porissa olisi tarpeen kehittää. Tällä hetkellä jalkapallon talviharjoittelu tapahtuu urheilukeskuksen lämmitettävällä tekonurmella sekä Karhuhallissa ja näiden lisäksi eri kokoisissa koulusaleissa. Karhuhallin osalta tarvetta vuoroihin on huomattavan paljon enemmän, mitä harjoitusaikaa on tarjolla. Jalkapallon lisäksi myös pesäpallo käyttää Karhuhallin jalkapallotilaa talviharjoitteluun. Musan kentän yleissuunnitelmassa on nostettu esiin varautuminen kentän lämmittämiseen talviharjoitteluolosuhteiden kehittämiseksi. Kentän lämmittämistä nykyaikaisin menetelmin, eri lämmitystapoja sekä mahdollisia lämmitystekniikkaan liittyviä synergiahyötyjä on tarpeen selvittää hankesuunnitelmavaiheessa. Mahdolliset päätökset lämmittämisestä tehdään hankesuunnitelman päätöksentekokäsittelyn yhteydessä.

Pääkenttä tulee valaista riittävän tehokkaasti, jotta kenttäalue on käytettävissä myös pimeinä aikoina ja että valaistus mahdollistaa sekä otteluiden pelaamisen että niiden kuvaamisen ja striimaamisen eri alustoilla. Keskelle isoa kenttäaluetta sijoitettavat valaisinpylväät jakavat kenttäalueen niin, että pääkenttä erottuu luonnollisesti muista kenttäalueista. Alue tulee aidata yleissuunnitelmassa esitetyllä tavalla, jotta pallot pysyvät niille tarkoitetuilla alueilla ja kenttäalueen eri osissa voi olla samanaikaista toimintaa.

2.2. Juniorikentät

Pääkentälle saadaan sijoitettua kaksi juniorijalkapallossa käytettävä 8v8-kenttää. Kentät sijoittuvat pääkentän kummallekin puolikkaalle pohjois-eteläsuunnassa. Pääkentän eteläpuolelle jäävälle osalle sijoitetaan nuorimpien junioreiden pelitapahtumakäyttöön soveltuvia 5v5-kenttiä. Pääkentän ulkopuolelle sijoittuvat kenttäalueet soveltuvat myös vanhempien junioreiden harjoittelukäyttöön. Kenttäalue on nykyiselläänkin kokonaisuudessaan käytössä ja pääkentän lisäksi alueelle on sijoitettu juniorikenttiä. Kenttäalue on tälläkin hetkellä jatkuvassa käytössä ja luonnonnurmi vaatii etenkin pääkentän rauhoittamista aika ajoin. Tekonurmipäällysteen myötä koko kenttäalue saadaan nykyistä tehokkaammin käyttöön.

Pääkäyttäjäseuran 670 harrastajasta valtaosa on junioreita ja seuran noin 20 ryhmää pelaa pelikauden aikana valtavan määrän otteluita ja harjoittelee kentällä säännöllisesti.

2.3. Katsomorakenteet

Kaupungin jalkapallo-olosuhteiden kehittämisen tilanne on muuttunut Musan kentän tarveselvityksen laatimisen jälkeen. Jalkapalloseurojen aloitteesta urheilukeskuksen tekonurmen aluetta on alettu kehittää kaupungin edustusjoukkueen jalkapallon olosuhteeksi. Tarveselvitys urheilukeskuksen tekonurmen kehittämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa marraskuun lopulla (KH 24.11.2025 § 499). Tarveselvityksessä on luotu suuntaviivat sekä urheilukeskuksen tekonurmen kehittämiselle edustusjoukkueen jalkapallon olosuhteena sekä kentän vieressä sijaitsevan pesäpallostadionin kehittämiselle. Ensimmäisessä vaiheessa urheilukeskuksen tekonurmen ympärille toteutetaan 1500 katsojan katetut katsomorakenteet oheispalvelutiloineen. Näin kenttäalue täyttää toteutuessaan tämänhetkiset korkeimman Porissa pelattavan sarjataso olosuhdevaatimukset Palloliiton lisenssiehtojen mukaisesti ja olosuhteet mahdollistavat myös nykyistä korkeamman sarjataso ottelutapahtumien järjestämisen kentällä. Myöhemmässä vaiheessa katsomorakenteita voidaan laajentaa tarpeen mukaan niin, että olosuhteet vastaavat pääsarjataso vaatimuksia.

Urheilukeskuksen tekonurmen kehittämissuunnitelmia ei ole huomioitu Musan kentän yleissuunnitelmassa, sillä aloite urheilukeskuksen tekonurmen kehittämisestä edustusjoukkueen jalkapallon olosuhteena nousi esiin vasta Porin stadionin peruskorjauksen ja siitä aiheutuvien väistötilatarpeiden yhteydessä. Urheilukeskuksen tekonurmen kehittämissuunnitelmat tulee kuitenkin huomioida Musan kentän toteutuksen suunnittelussa, sillä Musan kenttä sijaitsee urheilukeskuksen tekonurmesta noin 2 kilometrin päässä. Lähtökohtana on, että edustusjoukkueen ottelutapahtumat järjestetään urheilukeskuksen tekonurmella sen katsomorakenteiden ja oheistilojen valmistuttua.

Edellä kuvattu vaikuttaa myös Musan kentän katsomorakenteiden suunnitteluun ja mitoittamiseen. Yleissuunnitelmassa Musan kentän pääkentän katsomorakenteet on mitoitettu 900 katsojan katsomokapasiteetin mukaan. Pääkentällä tullaan pelaamaan pääasiassa junioriotteluita ja kenttä tulee toimimaan pääsarjatasen otteluiden varakenttänä. Katsomorakenteiden mitoittamista tehdään tarkemmin hankesuunnitteluvaiheessa.

Kenttäalueelle tulee toteuttaa pääkentän katsomorakenteiden lisäksi myös jonkinlaisia katsomorakenteita juniorikentille. Näitä voidaan toteuttaa joko kiinteinä tai siirrettävinä rakenteina. Siirrettävät katsomot mahdollistaisivat kenttäalueen katsomorakenteiden joustavan muokkaamisen niin, että esimerkiksi turnauksikäytössä 8v8-kentille saataisiin toteutettua katsomot pääkentän kumpaankin pätyyn, eli 8v8-kentän pitkälle sivulle. Tarvittaessa siirrettävät katsomot voisivat olla sijoitettuna joko 5v5-kenttien yhteyteen nuorimpien junioreiden vanhempia ja muita katsojia varten tai tarvittaessa niillä voidaan täydentää pääkentän kiinteää katsomorakennetta ja lisätä näin katsomokapasiteettia.

2.4. Alueen asukkaiden ja muiden käyttäjien tarpeet

Rinteentien varteen, aidatun kenttäalueen ulkopuolelle on Musan kentän yleissuunnitelmaan asetettu lähiliikuntapuisto, joka palvelisi sekä alueen asukkaita lähiliikuntapaikkana että seuran harrastajia oheisharjoittelun tukiharjoitteluna. Toimintojen suunnittelussa on otettu huomioon eri ikäryhmät leikki-ikäisistä senioreihin. Tavoitteena olisi luoda liikkumaan innostava ja helposti saavutettava alue, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Kävelyetäisyydellä Musan kentästä on runsaasti asutusta. Kenttä sijaitsee keskellä omakotitaloaluetta ja pienellä etäisyydellä kentästä on myös jonkin verran kerrostaloasutusta. Musan kentän yhteyteen sijoitettavat kuntoilulaitteet tarjoavat alueen eri ikäisille asukkaille mahdollisuuden omatoimiseen liikkumiseen. Yleissuunnitelmavaiheessa Rinteentielle aukeavan kuntoilun alueen ajateltiin avaavan kenttäaluetta laajemmin alueen asukkaille, kun nykyisellään kenttää ympäröivät aidat enemmänkin eristävät aluetta muilta kuin kentän käyttäjiltä.

Pohjoisimpana on ulkokuntoilun vyöhyke, joka jakaantuisi kolmeen toiminta-alueeseen. Osa ulkokuntoilun alueesta soveltuu muun muassa kehonpainoharjoitteluun ja toiminnalliseen harjoitteluun. Yksittäiset ulkokuntosalilaitteet on ryhmitelty omaksi kokonaisuudekseen toiminnallisen harjoittelun alueen eteläpuolelle. Rinteentien varteen suunnitellulla senioriliikunta-alueella pääpaino on ikäihmisten toimintakyvyn ja lihaskunnon ylläpitämistä ja kehittämistä tukevilla liikuntavälineillä. Ulkokuntoilun alueen eteläpuolella olisi monitoimikenttä ja parkour-alue, joiden tavoitteena on innostaa etenkin nuoria liikkumaan. Monitoimikenttä soveltuu muun muassa pienimuotoisiin pallopeleihin ja oheisharjoitteluun.

Alueen eteläpäässä, lähimpänä juniorikenttiä ja Musanmetsikön polkuverkostoa on yleissuunnitelmaan laadittu leikkipuisto. Pääpaino on liikunnallisissa leikkivälineissä, jotka kehittävät monipuolisesti muun muassa motoriikkaa, tasapainoa, ketteryyttä, lihasvoimaa ja aerobista kuntoa. Leikkipuiston sijainti etelämpänä lähempänä juniorikenttiä koettiin myös alueen asukkaiden mielestä parempana vaihtoehtona, sillä se lisää alueen turvallisuutta. Turvallisuuden takaamiseksi leikkipuisto aidataan muista toiminnoista erilliseksi alueeksi.

Monipuoliset ja hyvin saavutettavat lähiliikuntaolosuhteet tukevat laaja-alaisesti kaupunkilaisten omaehtoista liikkumista ja hyvinvointia. Hyvin saavutettavat lähiliikuntapaikat ovat erityisen tärkeitä lapsille sekä lapsiperheille. Saavutettavuuden lisäksi lähiliikuntapaikkojen tulee tarjota monipuolisesti erilaisia liikkumismahdollisuuksia eri ikä- ja liikkujaryhmät huomioiden. Liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelman tavoitteissa on tuotu esiin, että Porissa olisi kattava ja hyvin saavutettava lähiliikuntapaikkaverkosto omaehtoisen liikkumisen tukemiseksi. Suunnitelmaan tunnistettuja kehityskohteita ovat erityisesti katulajien ja ulkokuntoilun olosuhteiden kehittäminen. Tätä näkökulmaa on huomioitu Musan kentän tarveselvityksessä.

2.5. Pysäköinti

Musan kenttäalueen pysäköintiasiaa on ollut hankala ratkaista. Mahdollisia toteuttamistapoja on tutkittu sekä yleissuunnitelman laatimisvaiheessa että parhaillaan vireillä olevan kaavamuutoksen yhteydessä. Kenttäalueen länsipuolella sijaitsevan huoltorakennuksen yhteydessä olevaa pysäköintialuetta on laajennettu, mutta muut vaihtoehdot lisäpysäköinnin toteuttamiseksi ovat osoittautuneet mahdottomaksi toteuttaa. Tästä syystä jo edellä mainittua kenttäalueen länsipuolella toteutettua pysäköintialuetta tulee laajentaa. Luonnollisin laajennussuunta lienee nykyiseltä pysäköintialueelta länteen päin niin, että pysäköintialueen ja Tommilantien väliin jää puustoa. Näin pysäköintialueen laajentaminen muuttaa alueen kaupunkikuvaa mahdollisimman vähän. Yksi ongelmallisimpia kohtia on pysäköinti Rinteentien varteen pysäköintikieltoalueelle sekä kevyen liikenteen väylälle. Pysäköintialueen laajentaminen ohjaa pysäköintiä kenttäalueen itäpuolelta länsipuolelle, pois Rinteentieltä. Pysäköintialueen laajentaminen tulee huomioida vireillä olevassa asemakaavan muutosprosessissa. Musan kenttä on pääasiassa junioritoiminnan käytössä ja etenkin nuorimpien junioreiden sekä ottelu- ja turnauspäivien kohdalla pysäköintitilan tarve on merkittävä.

2.6. Huoltotilat

Musan kenttäalueen yleissuunnitelman mukaisen toteuttamisen myötä kentän käyttö lisääntyy entisestään. Kenttäalueen länsipuolella sijaitsee tällä hetkellä noin 10 vuotta sitten rakennettu huoltorakennus, missä on pukutilat kahdelle joukkueelle ja erotuomareille, yleisö-wc:t sekä kenttähenkilökunnan tilat varastoineen. Kasvava kentän käyttö tulee aiheuttamaan sen, että tarvetta myös huoltotilojen lisäämiselle ilmenee. Peräkkäiset ottelutapahtumat aiheuttavat sen, että

käytännössä kummankin ottelun joukkueille olisi tarpeen osoittaa omat pukutilat, eli jo tässä yhteydessä olisi ajoittain tarvetta neljälle pukuhuoneelle. Vaihtoehtoisia tapoja pukuhuonetilojen lisäämiseksi on esimerkiksi nykyisen huoltorakennuksen laajentaminen tai pukuhuoneiden toteuttaminen pääkatsomon alapuolelle.

3. Selvitys kaavatilanteesta

3.1. Yleissuunnitelma

Porin kaupunki käynnisti Musan kentän alueen yleissuunnitelman laatimisen joulukuussa 2022. Yleissuunnitelman tavoitteeksi asetettiin ratkaisujen etsiminen kenttäalueen keskeisten toimintojen kehittämiseen, sijoitteluun ja mitoittamiseen, sisäisen liikenteen järjestämiseen sekä aluerakenteiden, kuten aitojen, porttien ja valaistuksen sijoitteluun. Tavoitteena on ollut kehittää alueesta idyllinen ja toimiva paikka sekä merkittävän kokoluokan urheiluseuran harjoitus- ja kilpailutoiminnalle että asukkaita palvelevalla lähiliikunnalle. Alueen kehittäminen on myös osa koko kaupungin kattavaa Porin kaupunginhallituksen hyväksymää ”Liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma 2024–2030” 10.3.2025 §83.

Sen mukaan: *”Porin kaupungin ydintehtäviä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia. Keskeisiä kaupungin keinoja tässä työssä on luoda ja ylläpitää liikuntaolosuhteita, jotka palvelevat niin asukkaiden omatoimista liikkumista kuin organisoidusti tapahtuvaa liikunnan ja urheilun harrastamista sekä urheiluun liittyvää että muuta tapahtumatoimintaa. Hyvinvointivaikutusten lisäksi kaikki edellä mainitut palvelevat myös kaupungin vetomaisuuden ja elinvoiman kehittämistä.”*

Yleissuunnittelun tavoitteena on ollut laatia suunnitelma, jossa selvitetään nykyisten alueen toimintojen kehittämistarpeet. Lisäksi yleissuunnitelman avulla luotiin jatkosuunnittelun pohjaksi alueen kokonaisvaltaiselle kehittämiselle pitkällä aikavälillä (mm. liikuntapaikkatarpeet, alueen kehittäminen matkailun, kansallisen kaupunkipuiston ja tapahtumajärjestämisen näkökulmasta).

Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on myös huomioitu alueen luontoarvot ja ympäristön kestävä kehitys. Alueen suunnittelussa on pyritty säilyttämään mahdollisimman paljon luonnonmukaisia alueita ja huomioimaan alueen monimuotoisuus. Lisäksi on suunniteltu parannuksia alueen liikennejärjestelyihin, jotta alueelle pääsy olisi sujuvaa ja turvallista kaikille käyttäjille. Joukkoliikenteen yhteyksiä on pyritty parantamaan ja pysäköintialueiden sijoittelussa on huomioitu sekä autoilijoiden että pyöräilijöiden tarpeet.



Kuva 1. Havainnekuva Musan kenttä alueen yleissuunnitelmasta.

3.2. Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat 609 936 ja 609 2031. Asemakaavan 609 2031 sisäasiainministeriö on vahvistanut 3.9.1951. Asemakaavassa suunnittelualue on yleisten rakennusten tonttia (Y), puistoaluetta, urheilualuetta ja katuja. Kaavan 609 936 sisäasiainministeriö on vahvistanut 25.9.1986 ja tämän kaavan alueella kaavamuutos koskee katuja.

Alueen yleiskuvaus

Kaavamuutosalue on kaavoitettu puistoalueeksi, urheilualueeksi ja yleisten rakennusten alueeksi (Y). Kaavamuutosalueen itäreuna on katualue (Rinteentie). Suunnittelualue sijoittuu keskeiselle paikalle Musan ja Liinaharjan kaupunginosien rajalle. Suunnittelualuetta ympäröi Musan kaupunginosan puutalovaltainen pientaloalue. Urheilualue toimii Musan jalkapallokenttänä. Puistoalue on metsää, jossa kulkee polkuja.

Urheilukentän kohdalta maasto on tasaista ja metsän alueella hiukan kohoavaa etelään päin mentäessä. Suunnittelualueen korkeus on +6...+9 metriä merenpinnasta. Maaperä on eteläosassa hiekkamoreenia, lännessä karkeaa hietaa (pohjamaalajina hiekka) ja idässä karkeaa hietaa.

Asemakaavan vireilletulo

Kaavamuuotos on tullut vireille Porin kaupungin aloitteesta 18.12.2024. Kaavamuuotos on kaavoituskatsauksen 2024–2026 kohde L10. Musa 23 (VP asemakaavan muutos 1–3 v. Musan jalkapallokentän ja virkistysalueen kehittäminen).



Kuva 2. Musa 23. kaupunginosa ja Musan kenttä on uudessa asemaakaavassa merkattu VL-1 ja VU alueeksi.

Pysäköinti

Tärkeä osa asemakaavaa ovat pysäköintialueet, jotka on sijoitettu niin, että ne eivät haittaa alueen liikennettä ja mahdollistavat sujuvan saapumisen tapahtumiin. Myös joukkoliikenteen yhteydet on suunniteltu niin, että ne palvelevat alueelle saapuvia kävijöitä mahdollisimman tehokkaasti.


Rinteentien pysäköinti

Rinteentien katualuetta levennetään asemakaavassa vastaamaan kadun todellista tilannetta ja kaavamuutos ei aiheuta muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Kaavamuutosalueen pohjoisreunaan vuonna 2024 rakennettu levennys/jättöpaikka merkitään asemakaavaan. Kaavaan merkitään katualueeksi myös Rinteentiellä olemassa oleva kevyenliikenteenväylä. Asemakaavamuutos mahdollistaa uuden pysäköintipaikan rakentamisen Tommilantien varteen. Pysäköintialueen lisäämisen oletetaan vähentävän kadunvarsipysäköintiä ja sujuvoittavan liikennettä urheilukentällä järjestettävien tapahtumien aikana.

Tommilantien pysäköinti

Pysäköintiä ei ole kielletty Tommilantien varrella välillä vanha Siwa-Musan kentän liittymä. Metsän puolella kulkee kapea, 1 m leveä jalkakäytävä. Jalkakäytävän kapeuden vuoksi pysäköintiä osittain jalkakäytävälle ei ole turvallista sallia.

Asemakaavaan on merkitty varaus uudelle pysäköintialueelle nykyisen pysäköintialueen länsipuolelle (kuva 3).

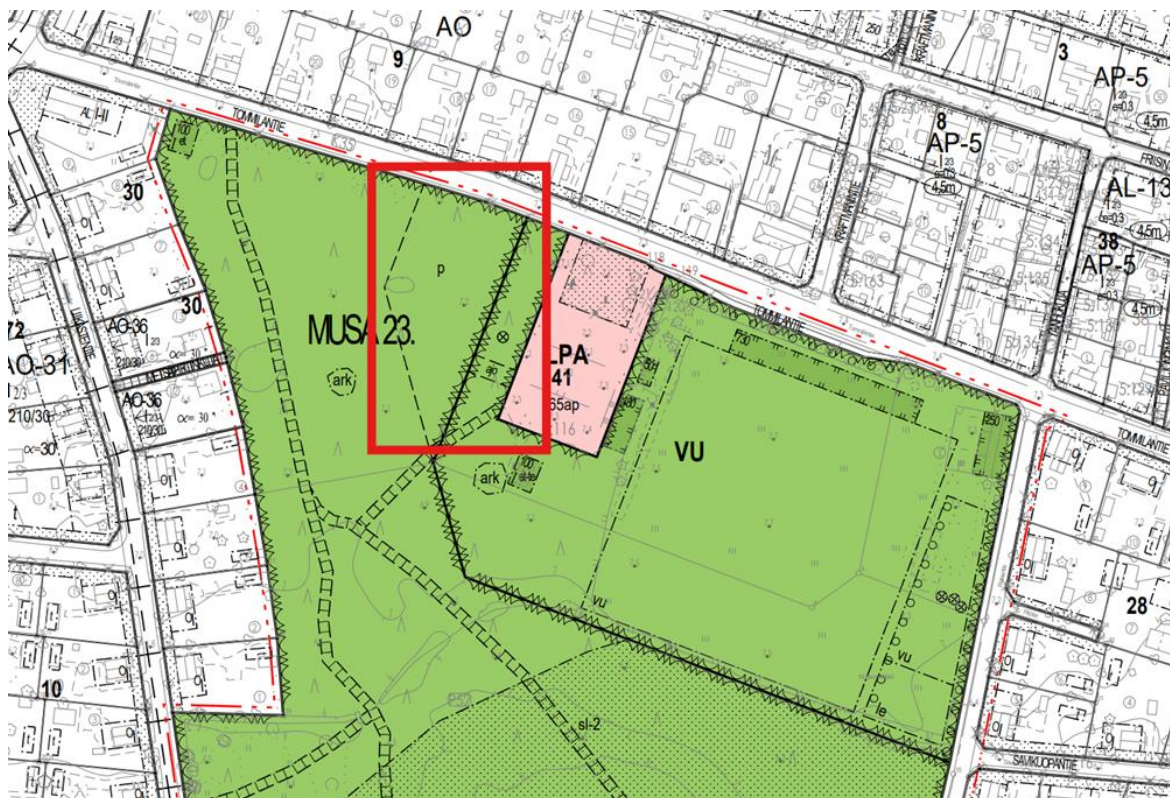

Kuva 3. Asemakaavaan ehdotettu pysäköintialueen laajennus.

4. Rakennushanke

4.1. Rahoituksen liittyvät näkökohdat

Musan kentän jalkapallotekonurmi-, yleisliikunta-, pysäköintialueen sekä leikkipuiston kehittämishankkeiden rahoitus on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Ensisijaisesti rahoitusta haetaan kaupungin budjetista, mutta myös ulkopuoliset rahoituslähteet, kuten valtionavustukset ovat keskeisessä roolissa. Rahoitukseen liittyen on hyvä tunnistaa myös Palloliiton ja UEFA:n kehitysohjelmien taloudellisen tuen tuomat mahdollisuudet jalkapallon olosuhdekehitykseen.

4.2. Rakennusalue

Hankesuunnittelun yhteydessä suoritetaan rakennusalueelle maaperä-, hulevesi- ja muita yleisiä tutkimuksia. Näillä tutkimuksilla määritetään alustavat rakennekerrokset, hulevesirakenteet ja muut vaadittavat rakenteet, rakennussuunnittelua ja budjetointia varten.

4.3. Hankkeen vaiheistus

Vaihe 1, Jalkapallotekonurmialue

Valaistun jalkapallotekonurmialueen rakentaminen. Pääkenttä on kooltaan 100–105 x 64–68 metriä ja turvaetäisyys kaikilla sivuilla on vähintään 3 metriä. Pääkentän eteläpuolelle sijoittuu kaksi 5v5-juniorikenttää sekä pienempi, etenkin harjoituskäyttöön soveltuva kenttä. Juniorikentät ovat kooltaan 40 x 30 metriä ja pienempi kenttä 30 x 15 metriä. Lisäksi pääkenttä on mahdollista jakaa kahdeksi 8v8-kentäksi tai neljäksi 5v5-kentäksi. Kenttäalue toteutetaan tekonurmikenttänä. Pääkentän valaistuksen lisäksi hankesuunnittelussa tulee huomioida kenttäalueen kattavat äänentoistojärjestelmät. Pääkentän kohdalla varustelussa tulee huomioida myös sähköinen tulostaulu. Kentän rakentamisen yhteydessä varaudutaan mahdollisesti tulevaisuudessa pääkentän lämmittämiseen, joka mahdollistaisi ulkokauden merkittävän pidentämisen. Päätöksiä asiassa tehdään hankesuunnitelman päätöksentekokäsittelyn yhteydessä.

Vaihe 2, Katsomoratkaisut

Jalkapallo tekonurmialueen pääkentän pohjoisreunalle rakennetaan 250 katsojan kiinteä katsomorakennus toimihenkilötiloihin, sisältäen kuuluttamon ja tilat tulospalvelulle sekä kuvaamiselle, muilta osin kenttäalue varustetaan helposti siirrettävillä kevyillä avokatsomorakenteilla. Hankesuunnitteluvaiheessa tarkastellaan vaiheen 1 ja 2 yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Vaihe 3, Lähiliikuntapuistoalue

Kenttä-alueen itäpuolelle, Rinteentien varteen, sijoittuu lähiliikuntapuistoalue. Aluetta kehitetään sekä alueen asukkaita että seuratoimintaa palvelevana lähiliikuntapaikkana.

Vaihe 4, Leikkiliikuntapuiston perusparannus ja laajentaminen

Nykyistä leikkipuistoa laajennetaan ja kunnostetaan. Leikkipuiston aluetta kehitetään alueen lapsia ja lapsiperheitä palvelevana leikkiliikuntapuistona.

4.4. Hankkeen alustava jatkoaikataulu

4.4.1. VAIHE 1, Jalkapallotekonurmen rakentaminen

Vuosi 2025/-26:

- kevät, tarveselvityksen hyväksyminen

Vuosi 2026:

- Hankesuunnittelu 6–12/2026

Vuosi 2027:

- Rakennussuunnittelu 2027

Vuosi 2029-2030:

- Toteuttaminen

4.4.2. VAIHE 2, Pääkentän ja tekonurmialueen katsomorakenteet

Vuosi 2025/-26:

- kevät, tarveselvityksen hyväksyminen

Vuosi 2026:

- Hankesuunnittelu 6–12/2026

Vuosi 2027:

- Rakennussuunnittelu 2027

Vuosi 2029-2030:

- Toteuttaminen

4.4.3. Vaihe 3, Rinteentien yleisliikunta-alueen rakentaminen

Vuosi 2025/-26:

- kevät, tarveselvityksen hyväksyminen

Vuosi 2026:

- Hankesuunnittelu 6–12/2026

Vuosi 2027->:

- Rakennussuunnittelu

Vuosi 2031->:

- Toteuttaminen

4.4.4. Vaihe 4, Leikkiliikuntapuisto

Vuosi 2025/-26:

- kevät, tarveselvityksen hyväksyminen

Vuosi 2026:

- Hankesuunnittelu 6–12/2026

Vuosi 2027->:

- Rakennussuunnittelu

Vuosi 2031->:

- Toteuttaminen

LIITTEET

LIITE 1: Musan kentän yleissuunnitelma

LIITE 2: Asemankaavan valmistelumateriaali
