Porin kaupunki
Kaupunginsairaalan B2-siiven peruskorjaus

Hankeaikataulu
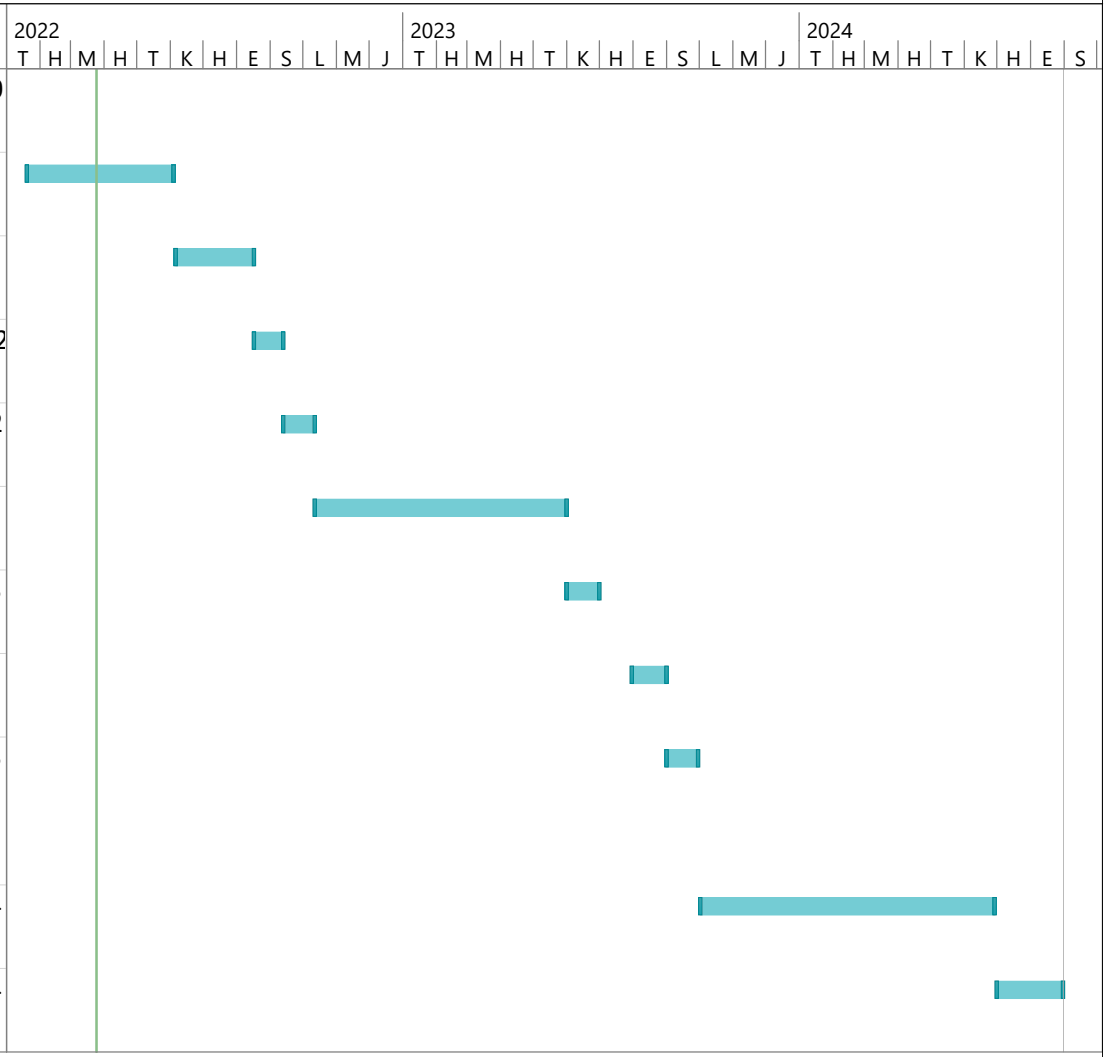
Tunnus	Tehtävän nimi	Kesto	Aloitus	Valmis
1	Tilatarvesimulointi	59 päivää	to 1.10.2020	ti 22.12.2020
2	Tarve- ja hankesuunnitelma	97 päivää	to 20.1.2022	pe 3.6.2022
3	Päätökset	52 päivää	ma 6.6.2022	ti 16.8.2022
4	Rakennussuunnittelun kilpailutus	19 päivää	ke 17.8.2022	ma 12.9.2022
5	Suunnittelijoiden valinta	21 päivää	ti 13.9.2022	ti 11.10.2022
6	Rakennussuunnittelu	166 päivä	ke 12.10.2022	ke 31.5.2023
7	Suunnitelmien hyväksyminen	22 päivää	to 1.6.2023	pe 30.6.2023
8	Urakkakilpailutus	24 päivää	ma 31.7.2023	to 31.8.2023
9	Urakoitsijoiden valinta ja rakentamisen valmistelu	21 päivää	pe 1.9.2023	pe 29.9.2023
10	Rakentaminen	195 päivä	ma 2.10.2023	pe 28.6.2024
11	Käyttöönotto ja muutto	45 päivää	ma 1.7.2024	pe 30.8.2024
